
Flak Heaven — спринты и план до раннего доступа

Версия от 16.10.2026. Спринты по 2 недели с 19.10.2026. Номера продолжают спринты 1–5 из **docs/sprint1**. Сроки — из решения владельца 15.10.2026 (журнал решений в docs/game-context.md) и чек-листа владельца. Всё, что помечено «предложение», ждёт твоего «да».

1. Где мы сейчас

Что	Состояние на 16.10
Сборка	Тестовая 3.4-t1 у владельца (Windows, Mac). В main — 3.4 плюс правки теста; 3.5 собираем по команде
Правки теста 3.4-t1	36 пунктов: 30 сделано, 2 частично (раскраски, портреты), 3 в работе (п. 1, 3, 37 — PR #22), 1 не начат (п. 22, ведомые)
3D	Модели переделываются по разбору каталога (plan-after-review.md), бой переводится со спрайтов на лёгкие 3D-модели
Открытые PR	#22 — 3D-ангар, подвесы, турели «Кита» и «Грача» из Blender. Впереди: портреты, ИИ врагов («Крепость», штанга заправщика), удаление гондолы
Steam и юридическое	Название свободно (L1). Не отвечены Q1–Q5, не проверены условия Meshy и Hunyuan, банк не выбран
Открытые вопросы концепции	Биомы 2–3 и финальные боссы придуманы под старый биом «Равнины» и не пересмотрены

2. Общая картина

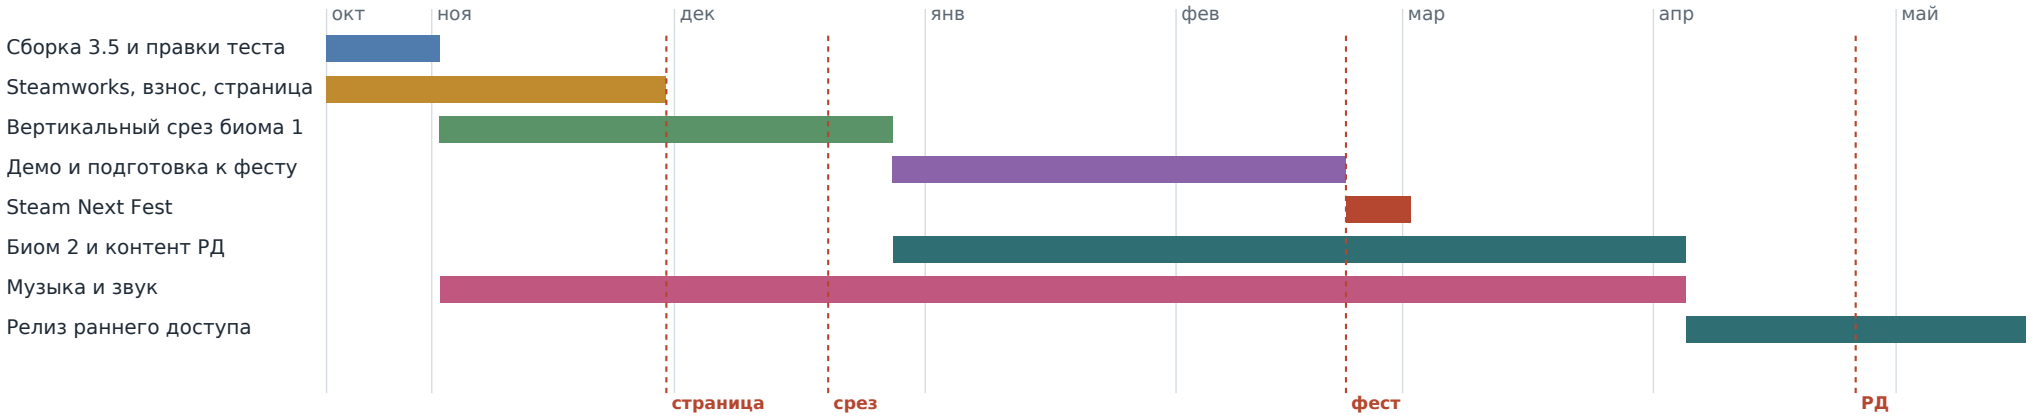

Что выходит и с каким объёмом

Выпуск	Когда	Биомы	Что это
Демо	Next Fest, 22.02–01.03.2027	1 — «Нагорье Шахрисанг»	Бесплатный кусок игры: 2 сложности, 3 класса ур. 1, урезанный ангар
Ранний доступ	апрель–май 2027	2 — Нагорье + биом 2 (решение 16.10)	Платная игра в Steam, дорабатывается обновлениями. Это и есть «релиз» плана

Выпуск	Когда	Биомы	Что это
Версия 1.0	после раннего доступа	3	Полная игра: биом 3, 36 перков, размеры оружия
Музыка	к срезу / к РД	своя на каждый биом	Меню, ангар, бой (слои по накалу), боссы, итоги: ~6 треков к демо, ~10 к РД

Биом 2 обязателен к раннему доступу (решение владельца 16.10). Чтобы успеть, его концепция — в спринте 7, производство — с 28.12 параллельно с демо. Если отстаём, урезаем оружие и врагов, а не биом.

Ключевые даты

Срок	Веха	Кто
25.10.2026	Ответы владельца на Q1–Q5 (страна, форма, на кого аккаунт, издатель, часовой пояс)	Владелец
01.11.2026	Регистрация в Steamworks, банк для выплат, налоговая анкета	Владелец
08.11.2026	Гейт 2: внешние тестеры на сборке 3.5 — «вылет весел?»	Владелец + аналитик
10.11.2026	Взнос Steam Direct $100 оплачен	Владелец
15.11.2026	Реестр лицензий ассетов (Meshy, ChatGPT, текстуры, Godot)	Claude → владелец
~20.11.2026	Страница «Скоро выйдет» отправлена на проверку Valve	Claude готовит, владелец отправляет
30.11.2026	Страница открыта, копятся вишлисты	—
20.12.2026	Вертикальный срез: биом 1 целиком. Объём раннего доступа заморожен	Все
10.01.2027	Регистрация на Steam Next Fest (сверить срок в Steamworks)	Владелец
25.01.2027	Демо на проверку для пресс-показа	Claude → владелец
08.02.2027	Остальные материалы феста	Claude → владелец
22.02–01.03.2027	Steam Next Fest	Все
апрель 2027	Сборка раннего доступа на проверку Valve	Владелец
апрель–май 2027	Ранний доступ в Steam	Все

3. Спринты

Слева — работа Claude (код, модели, документы), справа — что нужно от владельца. Сборки по-прежнему только по прямой команде.

Спринт	Цель	Разработка	Владелец
6 19.10 – 01.11.2026	**Закрыть правки теста 3.4-t1 и собрать 3.5** ● 3.5	• Слить PR #22: 3D-ангар, подвесы, турели из Blender (п. 1, 3) • Маленький PR: огонь из точек оружия на моделях (п. 37) • Бой на лёгких 3D-моделях: свои самолёты и ведомые, затем враги, затем ПВО; «Низкое» — спрайты • Портреты «Грача» и «Кита», PR со всеми 15 портретами (п. 4) • ИИ врагов: босс «Крепость», штанга заправщика, дрон со спаренной пушкой, без камикадзе • Убрать пушечную гондолу из пула оружия • Приоритеты целей у ведомых (п. 22) • Разбор отчётов внешних тестеров 3.3-t2 (17–18.10)	• Ответить на Q1–Q5 (до 25.10) • Прислать портреты «Грача» и «Кита» • Регистрация Steamworks, банк, налоговая анкета (до 01.11) • Команда «собери тестовую сборку 3.5» и прогон на своём ПК (лог FPS) • Проверить условия коммерческого использования Meshy и Hunyuan
7 02.11 – 15.11.2026	**Гейт 2 и решения по объёму** ● Срез	• Внешний тест 3.5 (3–5 человек), сводка логов и анкет к 08.11 • Исправления по логу 3.5: FPS на слабых ПК, жизнь боссов, «Кит» • Предложение урезанного объёма раннего доступа (см. раздел 4) • Концепция биома 2 (обязателен к раннему доступу) и набросок биома 3 под «Нагорье Шахрисанг» • Музыка: 3 варианта стиля с примерами, сервис и его права на коммерческое использование • Реестр лицензий ассетов (L2), черновик анкеты Valve об ИИ • Черновик страницы Steam: описание RU/EN, теги, 3 варианта капсулы	• Гейт 2: идём в срез или правим ядро (08.11) • Оплатить взнос $100 (до 10.11) • Решение по объёму раннего доступа • Утвердить концепцию биома 2 • Выбрать стиль музыки и сервис (B-17) • Выбрать капсулу и ключевой арт
8 16.11 – 29.11.2026	**Страница «Скоро выйдет»** ● Steam	• Скриншоты 1920×1080 из 3D-боя (≥ 5), капсулы всех размеров • Мини-боссы на 5-й и 10-й минуте, финальный босс «Крепость» по фазам • Третья активность и 4 сложности биома 1 • Раскраски самолётов (5 на самолёт), своя символика • Пилот звука: 8 эффектов • Музыка-пилот: тема главного меню и боевой трек биома 1	• Утвердить материалы страницы и отправить на проверку (~20.11) • Имя разработчика и издателя на странице • Открыть страницу до 30.11
9 30.11 – 13.12.2026	**Вертикальный срез: контент биома 1** ● Срез	• Звук v1 по всем событиям боя • Музыка биома 1: бой (2 трека, слои по накалу), босс «Крепость», ангар, экран итогов • Управление геймпадом (жалоба №1 в жанре), подготовка к Steam Deck • Обучение: первый вылет или экран «Как играть» • Вес и топливо в ангаре (узел «Бак» → объём бака) • Девлог №1 (DTF, VK, Telegram, англоязычные сообщества)	• Плейтест среза, 2–3 вылета на класс • Утвердить музыку биома 1 • Набрать 8–10 внешних тестеров
10 14.12 – 27.12.2026	**Гейт среза и заморозка объёма** ● Срез	• Тестовая сборка среза (по команде) для 8–10 тестеров • Сводка: от 60% хотят ещё, медиана сессии от 30 мин, без вылетов игры • Список «что входит в ранний доступ» — заморожен • Ветка демо: биом 1, 2 сложности, 3 класса ур. 1, урезанный ангар	• Решение: срез принят, объём раннего доступа заморожен (20.12)

Спринт	Цель	Разработка	Владелец
11 28.12.2026 – 10.01.2027	**Демо и регистрация на фест (праздники — облегчённый спринт)** ● Демо	• Полировка демо, баги по логам тестеров • Биом 2: рельеф, палитра, первые модели (старт раньше, чтобы успеть к РД) • Политика конфиденциальности (отчёты и телеметрия) • Трейлер 30–60 с со звуком v1 (черновик)	• Регистрация на Next Fest (до 10.01) • Утвердить политику конфиденциальности
12 11.01 – 24.01.2027	**Демо к пресс-показу** ● Демо	• Steam Playtest на 30–50 человек • Исправления по Playtest, производительность на слабых ПК • Трейлер финальный с музыкой из игры, обновить страницу • Биом 2: враги и наземная техника • Рассылка стримерам и прессе	• Отправить демо на проверку (до 25.01)
13 25.01 – 07.02.2027	**Материалы феста, начало биома 2** ● Демо	• Остальные материалы Next Fest (до 08.02) • Биом 2: деревни, ПВО, активности • Музыка биома 2: бой и босс • Проверка на Steam Deck	• Утвердить материалы феста
14 08.02 – 21.02.2027	**Разогрев перед фестом** ● Демо	• Девлоги, ролики, стримы, план трансляций на фест • Биом 2: финальный босс, первый играбельный вылет • Сборка демо «на фест» заморожена, только исправления	• Расписание стримов на фест
15 22.02 – 07.03.2027	**Steam Next Fest (22.02–01.03)** ● Фест	• Мониторинг демо, срочные исправления • Сбор отзывов, вишлистов, телеметрии • Разбор феста: что правим до раннего доступа	• Стримы и общение с игроками • Гейт: вишлисты и отзывы → дата раннего доступа
16 08.03 – 21.03.2027	**Контент раннего доступа** ● РД	• Правки по итогам феста • Биом 2: баланс, 4 сложности, полировка картинки • Сведение музыки и звука, громкости в «Настройках» • Оружие, модули и враги до объёма раннего доступа	• Цена и региональные цены (ориентир $9.99–12.99)
17 22.03 – 04.04.2027	**Заморозка контента** ● РД	• Баланс, локализация RU/EN, экран титров и лицензий (включая музыку) • Заявка Steam Deck, возрастной рейтинг IARC • Кандидат в релиз (release candidate)	• Анкета IARC, дата релиза
18 05.04 – 18.04.2027	**Сборка на проверку Valve** ● РД	• Только исправления блокеров • Материалы к запуску: трейлер РД, пост, рассылка	• Отправить сборку на проверку Valve
19 19.04 – 02.05.2027	**Запуск раннего доступа** ● РД	• Релиз в выбранный день (без конфликта с крупными распродажами) • Дежурство: краши, отзывы, горячие патчи	• Нажать «Release» в Steamworks
20 03.05 – 16.05.2027	**Резерв и первый патч** ● РД	• Резерв на сдвиг запуска до середины мая • Патч 1 по отзывам, план обновлений раннего доступа	• Решение по плану обновлений

4. Объём раннего доступа — предложение по урезанию

Лимиты из концепции (раздел 12) рассчитаны на ранний доступ осенью 2027. При апреле–мае 2027 их не успеть, поэтому предлагаю урезать: биом 3, 36 перков и размеры оружия — в версию 1.0. Решение — в спринте 7, заморозка — на гейте среза 20.12.

Что	Концепция (лимит РД)	Сейчас в игре	Предложение для РД
Биомы × сложности	3 × 4	1 биом, без сложностей	2 биома × 4 сложности — решено 16.10 (биом 3 — версия 1.0)
Музыка	стиль не решён (B-17)	нет	~10 треков: меню, ангар, бой и босс на каждый биом, итоги
Классы и самолёты	3 × 2	3 × 2	3 × 2 (без изменений)
Оружие	12 видов, 3 размера	6 видов (гондола убирается)	8–9 видов, размеры — позже
Враги	25–35	~11 + ПВО	18–22
Боссы	3 финальных + 6 мини	асы на 5/10/15 мин	2 финальных («Крепость» + босс биома 2) + 4 мини
Активности	3 + заправщик	2 + свой заправщик, транспорт	3 + заправщик
Перки	36	18 на класс	18 (ступени 3–4 — версия 1.0)
Вес и нагрузка	штраф до −25%	нет	упрощённо или после РД — решить в спринте 7
Геймпад / Steam Deck	Verified	нет	геймпад обязательно, Deck — «играбельно»

5. Риски

Риск	Что будет	Что делаем
Банк и выплаты Steamworks (главный)	Без реквизитов нет взноса и страницы, фест уезжает	Ответы Q1–Q4 до 25.10, легальный банк или издатель, бухгалтер один раз. Ограничения не обходим
Объём раннего доступа велик для темпа	Срыв апреля–мая	Урезанный объём (раздел 4), заморозка на гейте среза 20.12
FPS на слабых ПК после 3D-боя	Плохие отзывы демо	Лог I5 с реального ПК на 3.5, пресет «Низкое» со спрайтами, бюджет 5–15 тыс. треугольников
Права на ИИ-ассеты (Meshy, Hunyuan, ChatGPT)	Вопросы Valve, риск снятия страницы	Проверить условия до страницы, реестр лицензий к 15.11, честная анкета об ИИ
Музыка и звук не выбраны	Трейлер и демо без музыки; риск прав на ИИ-музыку	Стиль и сервис в спринте 7 (проверить права), пилот в 8, музыка биома 1 к срезу, биома 2 — к марту
Биом 2 не успевает (концепции ещё нет)	Срыв раннего доступа: биом 2 обязателен (решение 16.10)	Концепция в спринте 7, производство с 28.12 параллельно с демо; при отставании режем оружие и врагов, а не биом, или сдвигаем запуск к концу мая
Кредиты Meshy (244 на 16.10)	Не хватит на биом 2	Простые детали — Blender, следить за балансом, докупка — решение владельца
Next Fest — одна попытка	Сырое демо сожжёт шанс	Правило сдвига ниже

6. Правило сдвига

- Если к 10.11 взнос не оплачен или нет банка — страница переезжает на декабрь–январь, фест на июнь 2027, ранний доступ на осень 2027.
- Если гейт среза 20.12 не пройден (меньше 60% тестеров хотят ещё) — февральский фест не берём, идём на июньский; ранний доступ — осень 2027.
- Если к 25.01 демо не прошло Playtest без блокеров — та же схема: июнь вместо февраля.
- Если после феста меньше 7 000 вишлистов — обсуждаем перенос раннего доступа на лето–осень.

Next Fest можно пройти только один раз, поэтому сырое демо туда не везём.

7. Что нужно от владельца в ближайшие 4 недели

До	Что	Где
25.10	Ответить на Q1–Q5	тред «Чек-лист владельца», файл owner-checklist/checklist.md
по готовности	Прислать портреты «Грача» и «Кита»	тред «Прокачка и билды»
после PR #22	Слить PR #22 и следующие PR	github.com/kanta201196-hub/FlakHeaven/pulls → «Merge pull request» → «Confirm merge»
конец спринта 6	Команда «собери тестовую сборку 3.5», прогон на своём ПК, прислать лог	любой тред; лог в %APPDATA%\Godot\app_userdata\...
01.11	Регистрация в Steamworks, банк, налоговая анкета	partner.steamgames.com
08.11	Решение гейта 2	сводка придёт в тред
10.11	Взнос $100	partner.steamgames.com/steamdirect
